Planificación y Gestión del Proyecto de Creación y Puesta en Marcha de una Agencia Digital de Servicios Tecnológicos

Yaroslav Kuchuk
EAE Business School
Máster en Dirección y Gestión de Proyectos
18 de octubre de 2026

Planificación y Gestión del Proyecto de Creación y Puesta en Marcha de una Agencia Digital de Servicios Tecnológicos 1
1. Resumen ejecutivo 2
2. Acta de constitución del proyecto 3
2.1 Propósito y justificación del proyecto 3
2.2 Descripción de alto nivel del proyecto 4
2.3 Requisitos de alto nivel 5
2.4 Entregables de alto nivel 5
2.5 Stakeholders principales 6
2.6 Objetivos medibles 7
2.7 Presupuesto de alto nivel 7
2.8 Hitos principales 8
2.9 Restricciones y supuestos 8
2.10 Riesgos de alto nivel 9
3. Plan de gestión del proyecto 9
3.1 Plan de gestión del alcance 9
3.2 Plan de gestión del tiempo 15
3.3 Plan de gestión del coste 18
3.4 Plan de gestión de la calidad 18
3.5 Plan de gestión de los recursos 18
3.6 Plan de gestión de las comunicaciones 18
3.7 Plan de gestión de los riesgos 18
3.8 Plan de gestión de las adquisiciones 18
3.9 Plan de gestión de los interesados 18
3.10 Procedimiento de control integrado de cambios 18
3.11 Procedimiento de gestión de lecciones aprendidas 18
4. Conclusiones 18
5. Referencias 18
Anexos 18

1. Resumen ejecutivo

El presente Proyecto Final de Máster tiene como objetivo planificar la creación y puesta en funcionamiento de una agencia digital especializada en el desarrollo de software y la prestación de servicios tecnológicos para empresas. La organización tendrá su sede principal en Barcelona y ofrecerá inicialmente cinco líneas de servicio: desarrollo de software

a medida, soluciones cloud, DevOps, integración de inteligencia artificial y mantenimiento y evolución de sistemas.

El proyecto parte de una decisión estratégica previamente adoptada por el patrocinador. Antes de su inicio se habrá analizado y aprobado el business case, autorizado la creación de la empresa e identificado tres clientes comprometidos a participar en proyectos piloto. En consecuencia, la validación de la oportunidad de negocio y la captación de nuevos clientes no forman parte del alcance del proyecto. El objetivo consiste en transformar esta decisión estratégica en una organización plenamente operativa y preparada para prestar los servicios definidos.

El proyecto tendrá una duración máxima de 18 meses y un presupuesto autorizado de 750.000 €. Durante este periodo se constituirá legal y administrativamente la empresa, se implantará su estructura organizativa y modelo operativo, se incorporará y preparará un equipo multidisciplinar inicial de aproximadamente 15 profesionales y se desplegará la plataforma tecnológica necesaria para soportar el ciclo completo de desarrollo y entrega de software. Asimismo, se establecerán los procesos de gestión de proyectos, desarrollo, calidad, seguridad, gestión del conocimiento y relación con clientes, junto con las capacidades comerciales y de marketing necesarias para la posterior operación de la compañía.

La preparación operativa de la agencia será validada mediante la ejecución de exactamente tres proyectos piloto con los clientes previamente comprometidos. Estos proyectos permitirán comprobar de forma controlada el funcionamiento del modelo de delivery, los procesos internos y la plataforma tecnológica. Cada piloto dispondrá de criterios de aceptación previamente definidos y deberá ser formalmente aceptado por el cliente correspondiente. Los resultados obtenidos servirán para identificar e incorporar las mejoras necesarias antes de la transición definitiva a operaciones.

El éxito del proyecto se medirá mediante criterios de alcance, tiempo, coste y calidad. Entre ellos se incluyen la implantación de las cinco líneas de servicio previstas, la incorporación y preparación del equipo inicial, la disponibilidad de la plataforma tecnológica y de los procesos operativos, la aceptación del 100 % de los entregables principales y de los tres proyectos piloto, y un nivel medio de satisfacción de los clientes participantes igual o superior al 90 %. El proyecto deberá mantenerse dentro de una desviación máxima del ±5 % respecto a las líneas base aprobadas de tiempo y coste, respetando en todo caso las restricciones autorizadas.

El proyecto finalizará con la validación de la preparación operativa de la agencia, la aceptación de los entregables y la transferencia formal de responsabilidades a la organización permanente. A partir de ese momento, la captación de nuevos clientes, el crecimiento de las ventas, la expansión hacia nuevos mercados y la gestión de la rentabilidad pasarán a formar parte de la operación ordinaria del negocio y quedarán fuera del alcance del proyecto.

2. Acta de constitución del proyecto

2.1 Propósito y justificación del proyecto

El propósito del proyecto es crear y poner en funcionamiento una agencia digital especializada en el desarrollo de software y la prestación de servicios tecnológicos para empresas. La nueva organización ofrecerá inicialmente cinco líneas de servicio: desarrollo de software a medida, soluciones cloud, DevOps, integración de inteligencia artificial y mantenimiento y evolución de sistemas.

El proyecto parte de una decisión estratégica adoptada previamente por el patrocinador. Antes de su inicio se habrá analizado y aprobado el business case, autorizado

formalmente la creación de la empresa e identificado tres clientes comprometidos a participar en proyectos piloto. Por tanto, la evaluación de la oportunidad de negocio, la validación de la viabilidad comercial y la captación de nuevos clientes no forman parte del alcance del proyecto.

El proyecto comprenderá la constitución y organización de la empresa, la implantación de su modelo operativo y del catálogo de servicios previamente aprobado, la creación de la infraestructura tecnológica, el establecimiento de los procesos de desarrollo y gestión de proyectos, la contratación y preparación del equipo y la creación de las capacidades comerciales y de marketing necesarias para la posterior operación de la organización.

La capacidad operativa desarrollada será validada mediante la ejecución de tres proyectos piloto previamente acordados con los clientes participantes. De esta manera, será posible verificar de forma controlada la capacidad de la organización para gestionar y entregar proyectos reales antes de realizar la transición definitiva hacia las operaciones ordinarias.

La justificación del proyecto responde a la decisión estratégica de crear una organización tecnológica competitiva, escalable y preparada para prestar servicios profesionales de desarrollo de software y transformación digital. Frente a modelos tradicionales de prestación de servicios tecnológicos, la agencia se diseñará desde su inicio utilizando procesos modernos de desarrollo, automatización DevOps, infraestructura cloud y herramientas de inteligencia artificial, con el objetivo de reducir los tiempos de entrega, mejorar la calidad del software y optimizar los costes operativos.

El proyecto tendrá una duración máxima de 18 meses y un presupuesto autorizado de 750.000 €. Su finalización se producirá cuando la agencia disponga de la estructura organizativa, equipo, plataforma tecnológica, procesos y capacidades necesarias para operar, los tres proyectos piloto hayan sido ejecutados y aceptados y se haya completado formalmente la transición a operaciones.

2.2 Descripción de alto nivel del proyecto

El proyecto consiste en el diseño, creación y puesta en funcionamiento de una agencia digital especializada en desarrollo de software y servicios tecnológicos. La sede principal de la organización se establecerá en Barcelona, España, desde donde se coordinará la ejecución del proyecto.

La implantación será realizada por un equipo multidisciplinar compuesto por profesionales de dirección de proyectos, desarrollo de software, arquitectura de soluciones, DevOps y cloud, aseguramiento de calidad, UX/UI, recursos humanos, finanzas, marketing y administración. El modelo combinará recursos internos con la contratación puntual de proveedores y especialistas externos.

Durante el proyecto se diseñará e implantará la estructura organizativa y el modelo operativo de la agencia, se constituirá el equipo inicial, se desplegará la infraestructura tecnológica necesaria y se establecerán los procesos de desarrollo de software, gestión de proyectos, control de calidad, seguridad y relación con clientes.

Asimismo, se desarrollarán la identidad corporativa, los materiales y herramientas comerciales y los procesos necesarios para que la organización pueda iniciar su actividad comercial ordinaria después de la transición a operaciones. La captación de nuevos clientes durante el proyecto queda expresamente fuera de su alcance.

La entrega principal será una agencia digital plenamente operativa y preparada para prestar servicios a clientes reales, con un equipo multidisciplinar constituido, una plataforma

tecnológica y de desarrollo implantada, procesos de gestión y delivery definidos y un catálogo de servicios operativo.

La capacidad de la organización será validada mediante tres proyectos piloto ejecutados con clientes identificados y comprometidos antes del inicio del proyecto. El proyecto finalizará una vez completada la puesta en marcha de la organización, ejecutados y aceptados los tres pilotos, incorporadas las mejoras derivadas de su validación y realizada la transición formal hacia la operación ordinaria de la empresa.

2.3 Requisitos de alto nivel

Para garantizar que la agencia pueda iniciar su actividad de forma autónoma una vez finalizado el proyecto, se establecen los siguientes requisitos de alto nivel:

1. La empresa deberá estar legalmente constituida en España y disponer de la estructura administrativa, fiscal y contractual necesaria para prestar servicios profesionales.
2. Se deberá definir e implantar una estructura organizativa y un modelo operativo que establezcan las funciones, responsabilidades y mecanismos de coordinación entre las áreas de dirección, desarrollo, calidad, operaciones, comercial y administración.
3. La agencia deberá disponer de un equipo multidisciplinar capaz de gestionar y ejecutar de forma autónoma proyectos de desarrollo de software para clientes.
4. Se deberá implantar el catálogo inicial de servicios previamente aprobado, compuesto por desarrollo de software a medida, soluciones cloud, DevOps, integración de inteligencia artificial y mantenimiento y evolución de sistemas.
5. Se deberá implantar una plataforma tecnológica segura y escalable que soporte el ciclo completo de desarrollo de software, incluyendo gestión de código fuente, CI/CD, gestión de proyectos, pruebas, monitorización y documentación.
6. Los procesos de desarrollo y gestión deberán incorporar mecanismos de aseguramiento y control de calidad, seguridad de la información y protección de datos conforme a la normativa aplicable.
7. Se deberán establecer los procesos y herramientas comerciales necesarios para gestionar oportunidades, propuestas, contratos y relaciones con clientes durante la posterior fase de operaciones.
8. Se deberán ejecutar exactamente tres proyectos piloto con clientes identificados y comprometidos antes del inicio del proyecto.
9. Cada proyecto piloto deberá disponer de criterios de aceptación previamente definidos y deberá ser formalmente aceptado por el cliente participante.
10. La organización deberá disponer de procedimientos, documentación y conocimiento suficientes para realizar la transición a operaciones sin dependencia del equipo temporal encargado de la implantación.
11. La solución organizativa y tecnológica deberá ser escalable, permitiendo aumentar posteriormente el número de empleados, clientes y proyectos sin necesidad de rediseñar sustancialmente el modelo operativo.

2.4 Entregables de alto nivel

Además de la entrega principal —una agencia digital plenamente operativa y preparada para prestar servicios tecnológicos—, el proyecto contempla los siguientes entregables de alto nivel:

1. Modelo operativo y plan de implantación aprobados. Definición de la estructura operativa necesaria para implantar el modelo de empresa y el catálogo de servicios previamente aprobados por el patrocinador.

2. Estructura legal, administrativa y financiera operativa. Constitución de la empresa y establecimiento de los procesos administrativos, contables, fiscales, contractuales y financieros necesarios.
3. Estructura organizativa y equipo inicial constituido. Definición de roles y responsabilidades y contratación, incorporación y formación del equipo multidisciplinar.
4. Catálogo de servicios y modelo de delivery implantados. Implantación de las cinco líneas de servicio y del modelo utilizado para estimar, planificar, ejecutar y entregar proyectos.
5. Plataforma tecnológica e infraestructura de desarrollo implantadas. Infraestructura cloud, repositorios de código, CI/CD, herramientas de gestión, testing, documentación, monitorización y mecanismos de seguridad.
6. Sistema de procesos, calidad y gobierno implantado. Procesos de gestión de proyectos, ciclo de vida de desarrollo de software, aseguramiento de calidad, seguridad, gestión del conocimiento y seguimiento del desempeño.
7. Capacidades comerciales y de marketing preparadas para operaciones. Identidad corporativa, presencia digital, CRM, materiales comerciales, plantillas de propuestas y contratos y procesos comerciales necesarios para la posterior operación.
8. Tres proyectos piloto ejecutados y aceptados. Ejecución de los proyectos previamente acordados, aceptación formal por los clientes y documentación de los resultados.
9. Modelo operativo validado y transición a operaciones completada. Incorporación de las mejoras identificadas durante los pilotos, validación de la preparación operativa y transferencia formal de responsabilidades a la organización permanente.

La integración y aceptación de estos entregables permitirá realizar la transición a operaciones ordinarias y proceder al cierre formal del proyecto.

2.5 Stakeholders principales

Los principales stakeholders identificados son:

- Patrocinador del proyecto (Sponsor): Director General de la nueva agencia digital. Proporcionará dirección estratégica y apoyo ejecutivo, aprobará el presupuesto y los cambios principales, resolverá escalaciones y aceptará los principales entregables y el cierre del proyecto.
- Director del Proyecto (Project Manager): profesional de la organización ejecutora diferente del patrocinador, responsable de la planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre del proyecto.
- Equipo del proyecto: equipo multidisciplinar formado por responsables y especialistas de tecnología y arquitectura, desarrollo, DevOps y cloud, QA, UX/UI, recursos humanos, finanzas y administración, legal y marketing.
- Futuros empleados de la agencia: usuarios directos de los procesos, herramientas e infraestructura implantados.
- Consejo de administración / grupo investor: stakeholders interesados en la creación de la empresa y en los resultados del proyecto.
- Proveedores y colaboradores externos: proveedores cloud y software, servicios de selección de personal, asesoría legal y fiscal y otros especialistas necesarios.

- Organismos públicos y entidades reguladoras: administraciones y organismos relacionados con la constitución de la empresa y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales, de protección de datos y demás normativa aplicable.

2.6 Objetivos medibles

El objetivo general es crear e implantar una agencia digital plenamente operativa, cumpliendo los requisitos de alcance y calidad establecidos y manteniendo el desempeño del proyecto dentro de las líneas base aprobadas.

Los principales objetivos medibles son:

- Alcance: implantar las cinco líneas de servicio previamente aprobadas: desarrollo de software, cloud, DevOps, inteligencia artificial y mantenimiento.
- Alcance: implantar la infraestructura tecnológica y los procesos de gestión, calidad y seguridad necesarios para operar.
- Alcance: incorporar y preparar para operaciones un equipo inicial de aproximadamente 15 profesionales con funciones técnicas y de gestión.
- Alcance: ejecutar y obtener la aceptación formal de los tres proyectos piloto.
- Tiempo: mantener la desviación del cronograma dentro de un máximo de ±5 % respecto a la línea base aprobada, respetando una duración máxima de 18 meses.
- Coste: mantener la desviación del coste dentro de un máximo de ±5 % respecto a la línea base aprobada, respetando el presupuesto autorizado salvo cambios formalmente aprobados.
- Calidad: obtener la aceptación formal del 100 % de los entregables principales.
- Calidad: obtener la aceptación formal de los tres proyectos piloto y alcanzar una satisfacción media de los clientes participantes igual o superior al 90 %.

El proyecto se considerará finalizado con éxito cuando la agencia esté legalmente constituida y preparada para operar; estén implantadas las cinco líneas de servicio; el equipo inicial esté incorporado y preparado; la plataforma tecnológica y los procesos estén implantados y validados; los tres pilotos estén formalmente aceptados; se alcancen los criterios de satisfacción y aceptación definidos; las desviaciones de tiempo y coste se encuentren dentro de las tolerancias aprobadas; y se haya completado formalmente la transición a operaciones y el cierre del proyecto.

2.7 Presupuesto de alto nivel

El presupuesto autorizado del proyecto asciende a 750.000 €, distribuido inicialmente de la siguiente forma:

Tabla 1. Presupuesto de alto nivel del proyecto (Elaboración propia).

Partida	**Presupuesto**
Recursos humanos	430.000 €
Infraestructura tecnológica y servicios cloud	70.000 €
Licencias de software y herramientas	35.000 €
Marketing, branding y capacidades comerciales	55.000 €
Servicios profesionales externos	40.000 €
Formación y desarrollo del equipo	20.000 €
Oficina, equipamiento y gastos de puesta en marcha	40.000 €
Reserva de contingencia	60.000 €
Total	**750.000 €**

La distribución detallada del presupuesto se desarrollará durante la planificación mediante la estimación de costes asociada a la EDT/WBS. A partir de ella se establecerá la línea base de costes utilizada para medir y controlar el desempeño económico del proyecto.

2.8 Hitos principales

Tabla 2. Hitos principales del proyecto (Elaboración propia).

Mes	Hito
1	Inicio formal del proyecto
2	Modelo operativo y plan de implantación aprobados
3	Constitución legal y administrativa de la empresa
5	Diseño organizativo aprobado
7	Plataforma tecnológica básica operativa
9	Equipo inicial constituido
10	Modelo de delivery y procesos operativos aprobados
11	Preparación operativa para los proyectos piloto
12	Inicio de los tres proyectos piloto
16	Finalización y aceptación de los tres proyectos piloto
17	Validación de la preparación operativa
18	Transición a operaciones y cierre del proyecto

El último hito comprenderá la aceptación final de los entregables, la transferencia de responsabilidades a la organización permanente, el cierre administrativo y financiero y la recopilación de las lecciones aprendidas.

2.9 Restricciones y supuestos

Las principales restricciones del proyecto son:

- duración máxima de 18 meses;
- presupuesto autorizado máximo de 750.000 €, salvo cambios formalmente aprobados;
- establecimiento de la sede principal en Barcelona, permitiéndose trabajo híbrido o remoto para determinados perfiles;
- contratación progresiva condicionada por la disponibilidad de profesionales cualificados y por los límites presupuestarios;
- cumplimiento de la normativa laboral, fiscal, contractual, de protección de datos y seguridad de la información;
- dependencia de determinados proveedores tecnológicos externos;
- dimensionamiento inicial de la organización para aproximadamente 15 profesionales.

Para la planificación se consideran los siguientes supuestos:

- el *business case* y la creación de la empresa habrán sido aprobados antes del inicio;
- tres clientes habrán formalizado previamente su compromiso de participar en los pilotos;
- la financiación autorizada permanecerá disponible durante el ciclo de vida del proyecto;
- será posible contratar los perfiles necesarios dentro de los rangos salariales y plazos previstos;

- las principales plataformas cloud y herramientas tecnológicas estarán disponibles en condiciones compatibles con la planificación;
- los trámites legales y administrativos podrán completarse dentro de los plazos considerados;
- el equipo podrá completar su incorporación y formación según el calendario;
- los clientes piloto proporcionarán oportunamente información, accesos, feedback y recursos;
- los proveedores seleccionados podrán prestar sus servicios dentro de los niveles de coste, plazo y calidad acordados;
- los responsables de la organización permanente estarán disponibles para asumir las responsabilidades durante la transición a operaciones.

2.10 Riesgos de alto nivel

Durante la fase de iniciación se identifican los siguientes riesgos principales:

1. Dificultad para contratar perfiles especializados.
2. Incremento de costes salariales, tecnológicos o de proveedores.
3. Retrasos en la constitución legal y puesta en marcha de la empresa.
4. Cambios de requisitos o retrasos relacionados con los proyectos piloto.
5. Resultados insatisfactorios de los proyectos piloto que dificulten su aceptación.
6. Dependencia de personal clave durante las fases de implantación.
7. Dependencia de proveedores tecnológicos externos.
8. Incidentes de seguridad o incumplimientos relacionados con la protección de datos.
9. Implantación insuficiente del catálogo de servicios aprobado.
10. Crecimiento no controlado del alcance.
11. Problemas de integración o madurez insuficiente de los procesos internos.
12. Retrasos en la aceptación de entregables.
13. Cambios regulatorios o tecnológicos relevantes durante la ejecución.

Durante la planificación detallada, estos riesgos serán analizados y priorizados según su probabilidad e impacto. Para los riesgos prioritarios se establecerán responsables, acciones preventivas y estrategias de respuesta y contingencia. Asimismo, se determinará cuantitativamente la reserva de contingencia necesaria para cubrir los impactos económicos de los riesgos identificados.

3. Plan de gestión del proyecto

3.1 Plan de gestión del alcance

La gestión del alcance del proyecto tiene como objetivo asegurar que se realice todo el trabajo necesario, y únicamente el trabajo necesario, para crear, implantar y validar la capacidad operativa de la agencia digital y realizar posteriormente su transición formal a operaciones.

El alcance será definido y controlado a partir de los requisitos y entregables establecidos en el Acta de Constitución del Proyecto. Su descomposición se realizará mediante una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS), que organizará la totalidad del trabajo del proyecto en entregables, componentes y paquetes de trabajo gestionables.

La EDT constituirá la referencia principal para la planificación detallada del cronograma, la estimación y control de costes, la asignación de recursos, la identificación de riesgos y el seguimiento del avance del proyecto.

Cada paquete de trabajo dispondrá de una definición suficientemente detallada para permitir establecer su alcance, responsable, resultados esperados y criterios de aceptación. La información complementaria necesaria se documentará en el Diccionario de la EDT.

La aceptación de los entregables se realizará de acuerdo con los criterios definidos para cada uno de ellos. Los entregables principales requerirán aceptación formal y los tres proyectos piloto deberán ser formalmente aceptados por los clientes participantes.

Cualquier modificación que afecte al alcance aprobado deberá ser evaluada mediante el procedimiento de control integrado de cambios. No se incorporarán trabajos adicionales al proyecto sin analizar previamente su impacto sobre el alcance, cronograma, coste, recursos, calidad y riesgos y obtener, cuando corresponda, la aprobación establecida.

El proyecto incluye los trabajos necesarios para transformar la decisión estratégica previamente aprobada por el patrocinador en una agencia digital operativa y preparada para prestar servicios tecnológicos.

El alcance comprende:

1. La planificación detallada de la implantación y el establecimiento del modelo operativo de la agencia.
2. La constitución legal, administrativa, fiscal, contractual y financiera de la empresa en España.
3. El diseño e implantación de la estructura organizativa, incluyendo la definición de roles y responsabilidades.
4. La contratación, incorporación y preparación de un equipo multidisciplinar inicial de aproximadamente 15 profesionales.
5. La implantación de las cinco líneas de servicio previamente aprobadas: desarrollo de software a medida, soluciones cloud, DevOps, integración de inteligencia artificial y mantenimiento y evolución de sistemas.
6. El diseño e implantación del modelo de delivery utilizado para estimar, planificar, ejecutar, controlar y entregar los proyectos.
7. La implantación de la plataforma tecnológica necesaria para soportar el ciclo de desarrollo y entrega de software, incluyendo infraestructura cloud, repositorios de código, CI/CD, gestión de proyectos, testing, documentación, monitorización y mecanismos de seguridad.
8. La definición e implantación de los procesos de gestión de proyectos, desarrollo de software, calidad, seguridad, gestión del conocimiento y relación con clientes.
9. La creación de la identidad corporativa y de las capacidades comerciales y de marketing necesarias para la posterior operación de la agencia, incluyendo presencia digital, CRM, materiales comerciales y plantillas de propuestas y contratos.
10. La ejecución de exactamente tres proyectos piloto con los clientes identificados y comprometidos antes del inicio del proyecto.

11. La evaluación de los resultados de los proyectos piloto y la incorporación de las mejoras necesarias al modelo operativo.
12. La validación de la preparación operativa de la agencia.
13. La transferencia formal de responsabilidades, procesos, herramientas y conocimiento a la organización permanente.
14. El cierre administrativo y financiero del proyecto y la recopilación de las lecciones aprendidas.

Quedan expresamente fuera del alcance del proyecto:

1. La elaboración y aprobación del business case que justifica la creación de la agencia, ya que constituye una decisión previa al inicio del proyecto.
2. La decisión estratégica y autorización inicial para crear la empresa.
3. La identificación y captación de los tres clientes piloto, que deberán encontrarse comprometidos antes del inicio del proyecto.
4. La captación comercial de nuevos clientes distintos de los tres participantes en los proyectos piloto.
5. La operación ordinaria de la agencia después de la transferencia formal a operaciones.
6. La ejecución de nuevos proyectos comerciales posteriores a los tres pilotos definidos.
7. El crecimiento de las ventas y la gestión ordinaria de la rentabilidad de la empresa.
8. La expansión posterior hacia nuevos mercados, países o nuevas líneas de servicio.
9. El crecimiento de la plantilla más allá del dimensionamiento inicial previsto para la puesta en funcionamiento de la agencia.
10. Las modificaciones o ampliaciones posteriores del modelo operativo derivadas de la evolución ordinaria del negocio una vez cerrado el proyecto.

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) organiza jerárquicamente la totalidad del trabajo necesario para alcanzar los objetivos del proyecto y producir los entregables definidos. La descomposición se ha realizado siguiendo un enfoque orientado a entregables y aplicando la regla del 100 %, de forma que la EDT incluya tanto los trabajos necesarios para crear y poner en funcionamiento la agencia como las actividades de dirección, validación, transición y cierre del proyecto.

Los niveles superiores representan los principales componentes y entregables del proyecto, mientras que el nivel inferior identifica paquetes de trabajo suficientemente definidos para permitir posteriormente la estimación de duración, costes y recursos, así como la asignación de responsabilidades y el seguimiento de su ejecución.

La EDT constituye la línea base estructural para la planificación del proyecto. Los paquetes de trabajo identificados serán utilizados para desarrollar el cronograma, realizar la estimación detallada de costes y recursos, asignar responsabilidades e identificar y analizar los riesgos asociados a la ejecución.

La definición detallada de los paquetes de trabajo se recogerá en el Diccionario de la EDT. Cualquier modificación que afecte a la estructura o contenido de la EDT aprobada deberá gestionarse mediante el procedimiento de control integrado de cambios.


Tabla 3. Diccionario resumido de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) (Elaboración propia).

Código EDT	Paquete de trabajo / entregable	Descripción	Responsable	Criterios de aceptación
1.1	Dirección y gestión del proyecto	Planificación, coordinación, seguimiento y control integrado del proyecto durante todo su ciclo de vida.	Project Manager	Planes aprobados, seguimiento realizado y decisiones y cambios registrados.
1.2	Modelo operativo y planificación de la implantación	Diseño del modelo operativo, estructura organizativa y enfoque de implantación de la agencia.	Project Manager	Modelo operativo y plan de implantación aprobados por el Sponsor.
1.3	Constitución legal, administrativa y financiera	Constitución de la empresa y establecimiento de los mecanismos fiscales, administrativos, financieros y contractuales necesarios.	Finance / Legal Lead	Empresa legalmente constituida y procesos administrativos y financieros operativos.
1.4	Organización y equipo	Definición de roles, contratación, incorporación, formación y preparación del equipo inicial.	HR Lead	Equipo inicial incorporado, roles asignados y preparación operativa completada.
1.5	Catálogo de servicios y modelo de delivery	Implantación de las cinco líneas de servicio y del modelo utilizado para estimar, planificar, ejecutar y entregar proyectos.	Delivery Lead	Cinco líneas de servicio disponibles y modelo de delivery aprobado.
1.6	Plataforma tecnológica	Implantación de infraestructura cloud, repositorios, CI/CD, herramientas de gestión, testing, documentación, monitorización y seguridad.	Technology Lead	Componentes implantados, probados, documentados y disponibles para el equipo.

1.7	Procesos, calidad y gobierno	Implantación de los procesos de gestión de proyectos, desarrollo, calidad, seguridad, conocimiento y gobierno.	Project Manager / Quality Lead	Procesos documentados, aprobados y utilizados durante los pilotos.
1.8	Capacidades comerciales y de marketing	Preparación de identidad corporativa, presencia digital, CRM, materiales y procesos comerciales para operaciones.	Marketing / Commercial Lead	Capacidades y herramientas comerciales implantadas y disponibles para operaciones
1.9	Proyectos piloto	Preparación, ejecución, seguimiento y aceptación de exactamente tres proyectos piloto previamente acordados.	Delivery Lead	3/3 proyectos finalizados y formalmente aceptados por los clientes.
1.10	Validación y transición a operaciones	Incorporación de mejoras, validación de readiness y transferencia de procesos, herramientas, conocimiento y responsabilidades.	Project Manager / Sponsor	Preparación operativa validada y transferencia formalmente aceptada.
1.11	Cierre del proyecto	Cierre contractual, administrativo y financiero, aceptación final y recopilación de lecciones aprendidas.	Project Manager	Entregables aceptados, cierres completados e informe final aprobado.

El Diccionario detallado de los paquetes de trabajo de la EDT se incluye en el Anexo 1.

Figura 1. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) (Elaboración propia).

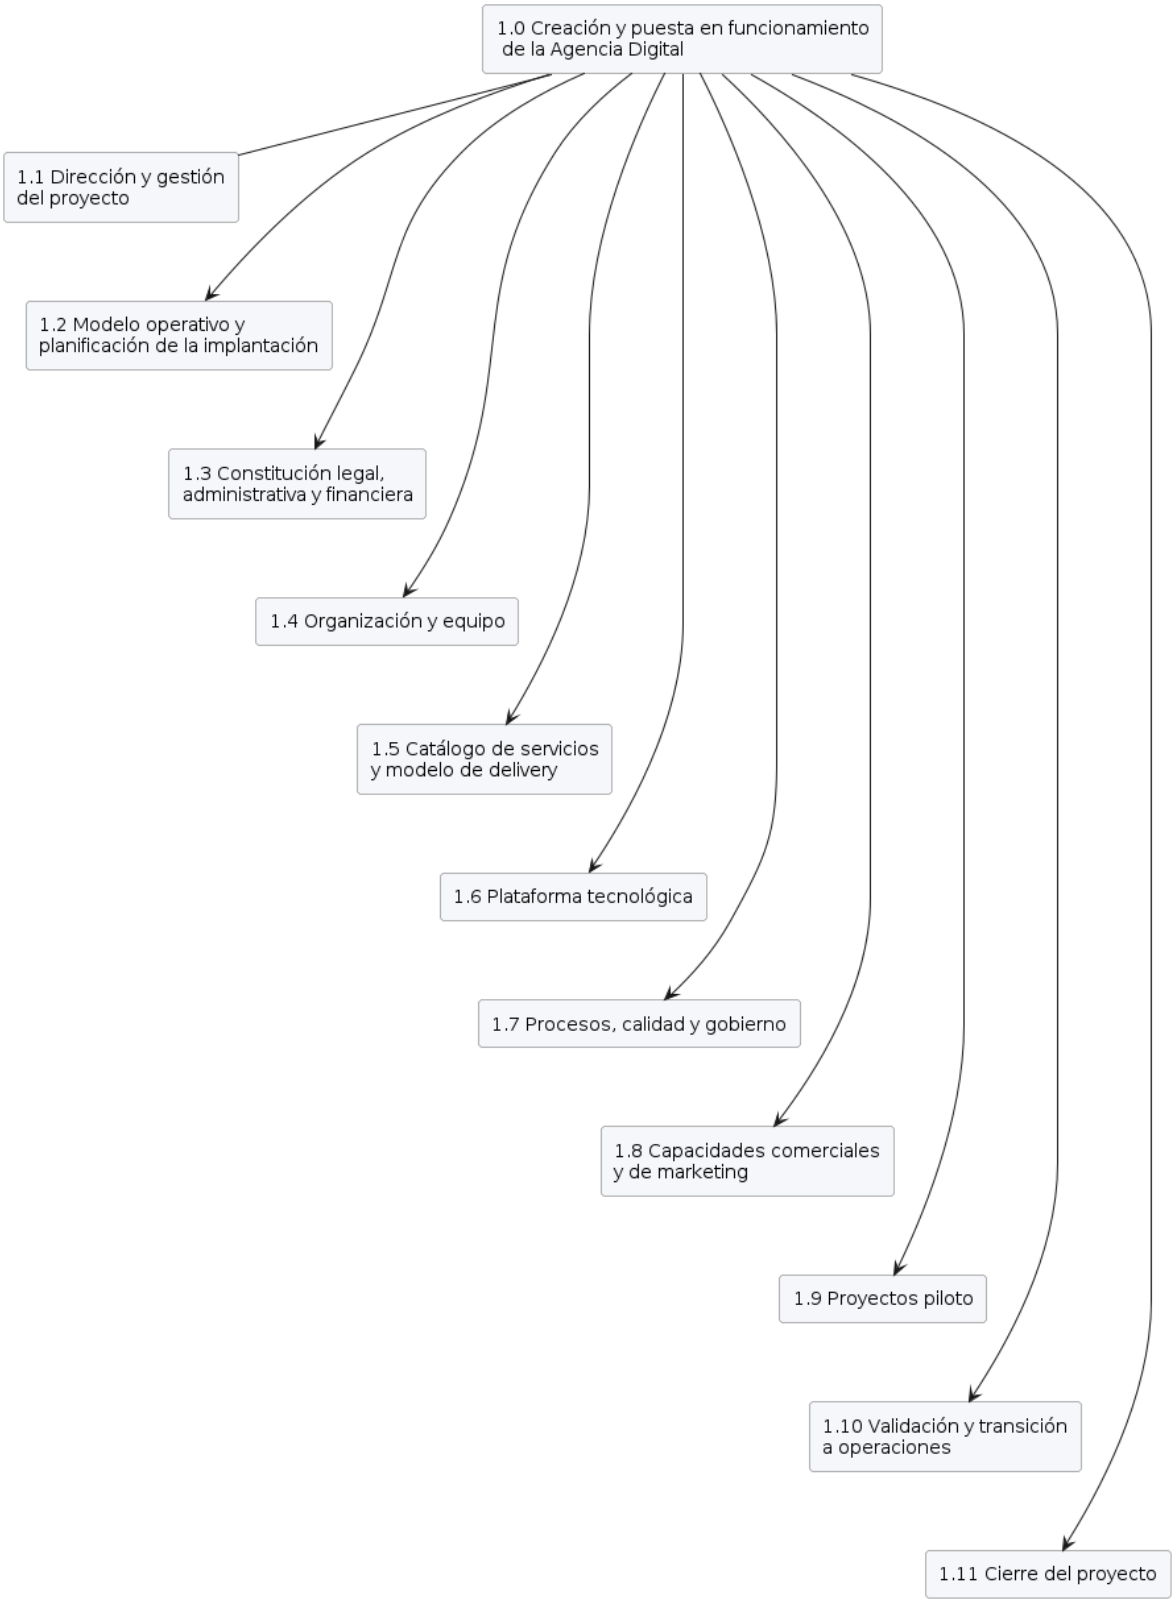

La diagrama detallada se incluye en el Anexo 1.

La EDT constituye la línea base estructural para la planificación del proyecto. Los paquetes de trabajo identificados serán utilizados para desarrollar el cronograma, realizar la estimación detallada de costes y recursos, asignar responsabilidades e identificar y analizar los riesgos asociados a la ejecución.

La definición detallada de los paquetes de trabajo se recogerá en el Diccionario de la EDT. Cualquier modificación que afecte a la estructura o contenido de la EDT aprobada deberá gestionarse mediante el procedimiento de control integrado de cambios.

3.2 Plan de gestión del tiempo

La gestión del tiempo del proyecto tiene como objetivo definir, desarrollar, mantener y controlar el cronograma necesario para completar el proyecto dentro del plazo máximo autorizado de 18 meses.

La planificación temporal se desarrollará a partir de los paquetes de trabajo identificados en la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT). Para cada paquete se definirán las actividades necesarias para producir los entregables correspondientes, estableciendo su secuencia lógica, dependencias, duración estimada y principales responsables.

Las actividades se organizarán teniendo en cuenta las relaciones de precedencia entre los diferentes componentes del proyecto. Cuando sea posible, determinadas actividades podrán ejecutarse en paralelo con el objetivo de optimizar la duración global, siempre que no se comprometan los requisitos de calidad, disponibilidad de recursos o dependencias técnicas y organizativas.

Las estimaciones de duración se realizarán considerando la complejidad de las actividades, la disponibilidad prevista de recursos, las dependencias internas y externas y los riesgos identificados. Las estimaciones serán revisadas durante la planificación detallada y podrán actualizarse mediante el procedimiento de control integrado de cambios cuando se produzcan modificaciones que afecten a la línea base aprobada.

Una vez definidas y secuenciadas las actividades, se establecerá el cronograma del proyecto y se determinarán sus principales hitos. El cronograma aprobado constituirá la línea base del cronograma y será utilizado como referencia para medir y controlar el avance durante la ejecución.

El seguimiento se realizará mediante la comparación periódica entre las fechas planificadas y las fechas reales o previstas de finalización. Se prestará especial atención a las actividades críticas y a aquellas desviaciones que puedan afectar a los principales hitos o a la fecha final del proyecto.

De acuerdo con los objetivos establecidos en el Acta de Constitución, la desviación del cronograma deberá mantenerse dentro de un máximo de ±5 % respecto a la línea base aprobada, sin superar en ningún caso la duración máxima autorizada de 18 meses salvo que exista un cambio formalmente aprobado.

Definición y secuenciación de actividades

Las actividades del proyecto se han definido a partir de los principales componentes de la EDT, manteniendo la trazabilidad entre el alcance aprobado y el cronograma. La secuenciación considera las dependencias lógicas existentes entre los diferentes entregables, así como la posibilidad de ejecutar determinados trabajos en paralelo.

La dirección y gestión del proyecto se desarrollará durante todo el ciclo de vida. Durante los primeros meses se realizarán en paralelo la definición del modelo operativo y la

constitución legal, administrativa y financiera de la empresa. La aprobación del modelo operativo permitirá avanzar progresivamente en la organización del equipo, la implantación del catálogo de servicios, la plataforma tecnológica, los procesos internos y las capacidades comerciales.

Una vez alcanzado el nivel de preparación necesario, se iniciarán los tres proyectos piloto previamente acordados. Los resultados de estos proyectos permitirán validar el modelo operativo e identificar las mejoras necesarias antes de realizar la transición formal a operaciones y proceder al cierre del proyecto.

Esto refleja la lógica ya establecida en el alcance: los tres pilotos forman parte del proyecto y la operación comercial ordinaria comienza después de la transferencia formal.

Tabla 4. Cronograma maestro del proyecto

EDT	Actividad / componente	Inicio	Fin	Duración	Predecesora principal
1.1	Dirección y gestión del proyecto	M1	M18	18 meses	-
1.2	Modelo operativo y planificación de la implantación	M1	M2	2 meses	-
1.3	Constitución legal, administrativa y financiera	M1	M3	3 meses	-
1.4	Organización y equipo	M2	M9	8 meses	1.2
1.5	Catálogo de servicios y modelo de delivery	M2	M10	9 meses	1.2
1.6	Plataforma tecnológica	M2	M7	6 meses	1.2
1.7	Procesos, calidad y gobierno	M3	M10	8 meses	1.2
1.8	Capacidades comerciales y de marketing	M4	M11	8 meses	1.2, 1.3
1.9.1	Preparación de los proyectos piloto	M10	M11	2 meses	1.4, 1.5, 1.6, 1.7
1.9.2 – 1.9.4	Ejecución de los tres proyectos piloto	M12	M15	4 meses	1.9.1
1.9.5	Evaluación conjunta de resultados	M15	M16	2 meses	1.9.2–1.9.4
1.9.6	Identificación de mejoras	M16	M16	1 mes	1.9.5
1.10.1	Implantación de mejoras derivadas de los pilotos	M16	M17	2 meses	1.9.6
1.10.2	Validación de la preparación operativa	M17	M17	1 mes	1.10.1
1.10.3 – 1.10.5	Transferencia a operaciones	M17	M18	2 meses	1.10.2

1.10.6	Aceptación de la transición	M18	M18	1 mes	1.10.3–1.10.5
1.11.1	Cierre del proyecto	M18	M18	1 mes	1.10.6

Los hitos representan puntos de control relevantes que permiten verificar la consecución de resultados clave y evaluar el avance global del proyecto. Los hitos no representan actividades con duración propia, sino eventos asociados a la finalización o aprobación de entregables relevantes.

Tabla 5. Hitos principales del cronograma

ID	Mes	Hito
H01	M1	Inicio formal del proyecto
H02	M2	Modelo operativo y plan de implantación aprobados
H03	M3	Constitución legal y administrativa completada
H04	M5	Diseño organizativo aprobado
H05	M7	Plataforma tecnológica básica operativa
H06	M9	Equipo inicial constituido
H07	M10	Modelo de delivery y procesos operativos aprobados
H08	M11	Preparación operativa para pilotos completada
H09	M12	Inicio de los tres proyectos piloto
H10	M16	Tres proyectos piloto finalizados y aceptados
H11	M17	Preparación operativa validada
H12	M18	Transición a operaciones y cierre del proyecto

Una vez aprobado por el Sponsor y el Project Manager, el cronograma constituirá la línea base del cronograma del proyecto. Esta línea base será utilizada como referencia para evaluar el desempeño temporal durante la ejecución.

El Project Manager realizará un seguimiento periódico del avance de las actividades, comparando las fechas y duraciones planificadas con el avance real y las previsiones actualizadas. El seguimiento prestará especial atención a las dependencias entre actividades, los hitos principales y las actividades cuya desviación pueda afectar a la fecha de finalización del proyecto.


Las desviaciones detectadas serán analizadas para determinar sus causas, impacto y necesidad de acciones correctivas o preventivas. Cuando una desviación pueda afectar a un hito principal, a la tolerancia temporal establecida o a la fecha final del proyecto, el Project Manager deberá evaluar alternativas de recuperación del cronograma.

Las acciones podrán incluir la reordenación de actividades, la ejecución en paralelo de trabajos inicialmente secuenciales cuando resulte viable, la reasignación de recursos o la

modificación de prioridades. Cualquier medida que implique una modificación de la línea base aprobada deberá gestionarse mediante el procedimiento de control integrado de cambios.

Como criterio de control, la desviación temporal global deberá mantenerse dentro de un máximo de ±5 % respecto a la línea base aprobada. La duración total no podrá superar los 18 meses salvo mediante una modificación formalmente aprobada.

Figura 2. Cronograma maestro del proyecto (M1–M18)

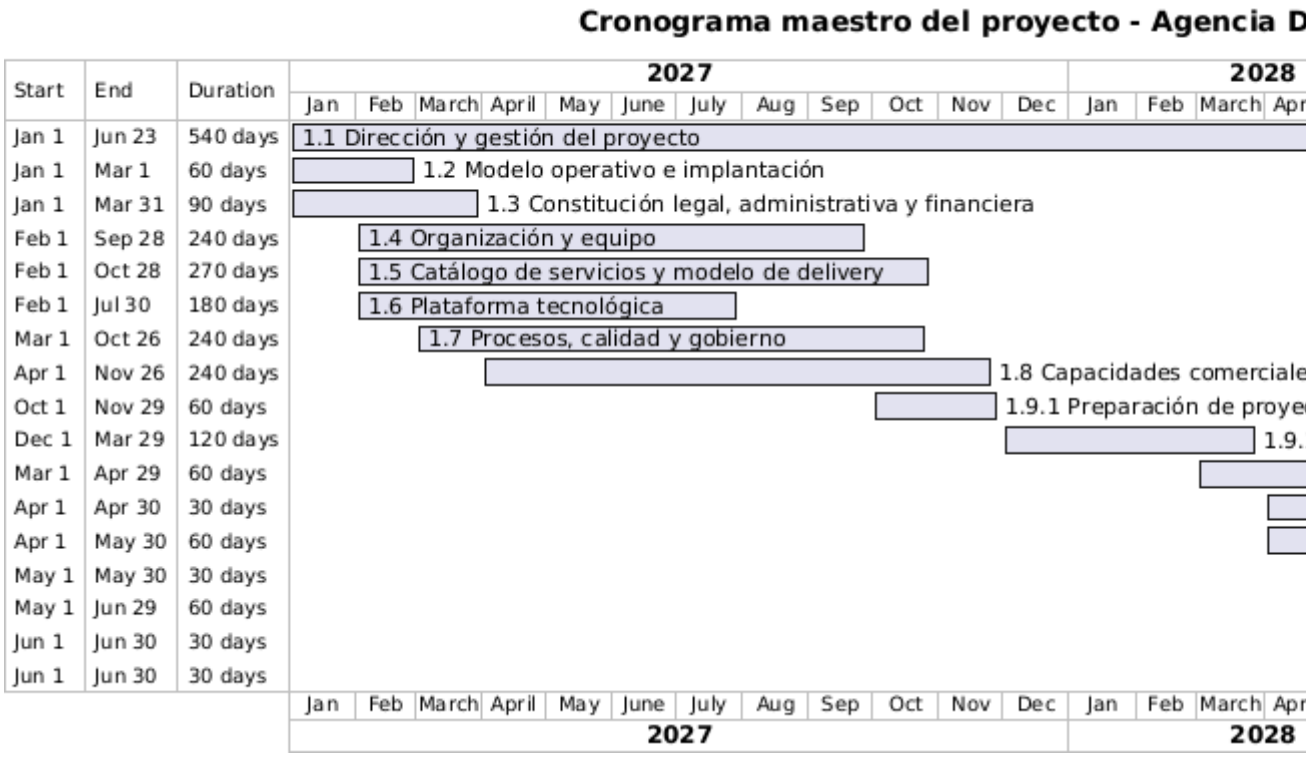

3.3 Plan de gestión del coste

3.4 Plan de gestión de la calidad

3.5 Plan de gestión de los recursos

3.6 Plan de gestión de las comunicaciones

3.7 Plan de gestión de los riesgos

3.8 Plan de gestión de las adquisiciones

3.9 Plan de gestión de los interesados

3.10 Procedimiento de control integrado de cambios

3.11 Procedimiento de gestión de lecciones aprendidas

4. Conclusiones

5. Referencias

Anexos
